

FORMULARIO DE AVISO DE CAMBIO

MOC # 4645

Sección 1: Formulario de solicitud de notificación de cambio

Iniciador:	Salvador Alvarez	Fecha:	22/04/2025	# Requi o PO (Si ya existe):	N/A	Permanente	☒	Emergencia	☐
Área:	John Deere ISO 7	ID Equi.:		Temporal		Menor	☐		
Departamento:	Automatizacion	MoC Procesos:					☒	MoC Servicios:	
Descripción del cambio propuesto:				Fecha de Caducidad de MOC temporal:				30/07/2025	

Movimiento a area, instalación y puesta en marcha de estaciones semi automaticas para ensamble en Cuarto limpio del NPI Gecko de Jon Deere

Sección 2: Base técnica / Motivo de la solicitud de cambio

Nueva linea de ensamble mecanico Semi Automatico para un NPI. Conformado por 8 estaciones: ST01 Camera Modile / ST02 Main Board / ST03 Camera and Main Board / ST04 Main Board LEDs / ST05 Moisture Absorber / ST06 Bottom and Top / ST07 Desiccant Cartidge / ST08 Desiccant cover / ST09 Cover Glass and Gasket. La medida de todas las estaciones es de (D x W x H) 1m x 1m x 2.1m

Sección 3: Descripción del modo de instalación (Ver pestaña de referencia "Descripción")

Materiales a utilizar

Mula manual

Equipo de EPP

Se ingresaran equipos por medio de mulas desde el area MRO pasando por pasillo de recibos hasta bajar por pasillo lateral hasta llegar a linea 201 e ingresar a cuarto limpio ISO 7, se retira equipo de transporte y se acomodan maquinas en el area de layout indicada, se conectan los equipos para hacer una validacion de funcionamiento de las estaciones

ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO (DIBUJOS, ESPECIFICACIONES, EVALUACIÓN DE RIESGOS)

Sección 4: REVISIÓN Y APOYO *Llenar e imprimir Action Tracker*

Participantes	Requer.	Aprobado	Firma	Fecha	Comentarios
OPERACIÓN / GERENTE DE AREA	YES	OK	<i>[Signature]</i>	Apr. 29, 2025	<i>[Signature]</i>
MANTENIMIENTO / INSTALACIONES	YES	OK	<i>[Signature]</i>	APR. 29, 2025	Ver nota layout
INGENIERIA	YES	OK	<i>[Signature]</i>	APR. 29, 2025	OK
Responsable de ingeniería industrial (Responsable de verificación de PCN)	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Líder de MOC Procesos (Si es de Servicio s)	NO				
IT	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
EHS	Siempre	OK	<i>Raul Quiñones</i>	02 May 2025	Seguimiento action tracker
Otros: Protección Planta / Security	Siempre	OK	<i>[Signature]</i>	29/04/25	OK
Otros: Lean Six Sigma	NO	N/A	N/A	N/A	N/A

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.

Archivo muerto: 1 año

Medio de Registro: Fisico Digital

Otros: (Líder de célula/ área impactada)					
Otros: (Líder de célula/ área impactada) <i>EHJLUE</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>Ricardo Santillana</i>	<i>30 Abr./25</i>	<i>N/A.</i>
Otros: (Departamento ESD)	NO	N/A	N/A	N/A	N/A

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.
 Archivo muerto: 1 año
 Medio de Registro: Físico Digital

Sección 5: Revisión de Riesgos *NOTA: Revisar pestaña "Guía MOC" y completarla

1 ¿Hay nuevos equipos, máquinas o instalaciones? (ej. CNC, HVAC, Prensa, Conveyor)	SÍ	X	NO	
En caso afirmativo, el sitio debe completar la pestaña Equipo y Proceso				
2 ¿Hay un nuevo proceso? (ej. nuevo estampado de plástico, nuevo proceso SMT)	SÍ	X	NO	
En caso afirmativo, el sitio debe completar la pestaña Equipo y Proceso				
3 ¿Hay algún cambio en los equipos y/o servicios de las instalaciones?	SÍ		NO	X
En caso afirmativo, el sitio deberá completar la pestaña de instalaciones, equipos, servicios				
4 ¿Hay algún nuevo riesgo de salud ocupacional con el MOC? (Ej. Químico, Ergonómico, Ruido)	SÍ	X	NO	
En caso afirmativo, el sitio deberá completar la pestaña de Salud Ocupacional				
5 ¿Existe algún cambio en el ambiente? (Ej. Proceso genera residuos o Emisiones al Aire)	SÍ		NO	X
En caso afirmativo, el sitio debe completar la pestaña Medio Ambiente				
6 ¿Hay algún cambio de programación al equipo o maquinaria?	SÍ		NO	X
En caso afirmativo, el sitio completará la sección de Controlador Lógico Programable (PLC) de la pestaña Equipo y proceso				
7 ¿Hay una reubicación, nuevo proceso o nuevo trabajo? (ej. Reubicación o nuevas estaciones de trabajo, incluida uso de herramientas para hacer la actividad)	SÍ	X	NO	
En caso afirmativo, el sitio debe completar una nueva Evaluación de Riesgos de Seguridad o RA (16-HS80-8000-00019)				
8 ¿Se está usando un nuevo EPP o hay un cambio en el EPP existente?				X
En caso afirmativo, el sitio debe completar un nuevo formulario de evaluación de EPP (16-HS80-8000-00041)				
9 ¿Hay una nueva fuente de radiación (láser, gamma, rayos X, etc.)?	SÍ		NO	X
En caso afirmativo, el sitio debe completar una evaluación de riesgo de radiación o láser (16-HS80-8000-00010 MRA, RA)				
10 ¿Requiere aprobación de Cliente?	SÍ		NO	X
En caso afirmativo, adjuntar evidencia de cliente en el MOC y revise con Calidad para obtener firma de ellos en Sección 4				

Sección 6: Actualizaciones requeridas / Notificaciones (internas / externas)

Actualizaciones Requeridas	Documento Ref.	Fecha Asignada	Responsable	Verificado por:
Instrucciones de trabajo, SOP, AV's, otros	N/A	N/A	N/A	EHS
Dibujos / Layouts	Layout	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Sistema de Gestión de EHS (PR Local de EHS)	16-HS20-8000-00033	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Plan de Contingencia	16-EM30-6500-00001	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Permisos / Licencias EHS	16-HS80-8000-00031	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Procedimiento Locales	SE-HS20-00012	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Entrenamientos	SI	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Evaluación de Riesgo del área (RA)	16-HS80-8000-00019	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Notificación Interna	N/A	N/A	N/A	EHS
Notificación Reglamentaria	N/A	4/22/2025	Salvador Alvarez	EHS
Proyecto Aprobado Por:	<i>Erick Grajeda Erick Grajeda</i>		Fecha:	<i>22/01/2025</i>

***NOTA: Espacios vacíos que no apliquen, escribir N/A**

Proyecto Cancelado/ Rechazado	SÍ		No	
Razón de Cancelación/ Rechazo: <i>Aprobado</i>				

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.

Archivo muerto: 1 año

Medio de Registro: Físico Digital

Administración del cambio Lista de Actividades o Acciones

Área / Célula Embarques		Fecha Evaluación: 1/Abr/2025			
Líder del cambio (Nombre y Firma): Daniel Chavez		Fecha Tentativa del Cambio: 1 / May / 25			
Esta hoja debe ser completada por EHS para considerar al menos las acciones críticas y las propias de la naturaleza del cambio como solicitud de permisos de permisos, análisis de riesgos y medidas de prevención para esto (EPP, aislamiento de áreas, etc.)					
NOTA. Todas las actividades CRÍTICAS deberán quedar cerradas antes del arranque del proceso u operación o este documento queda sin validez.					
No.	Actividad/Acción	Actividad CRÍTICA	Responsable	# de Acción EHSIP / JOS / SARQC	Fecha de vencimiento
		NO			
1	Generar MOC de Operaciones (Hacer Acción de Seguimiento)	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
2	Actualizar/Generar RA del área impactada (Hacer Acción de Seguimiento EHSIP)	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
3	Realizar PSSR al termino del MOC (Hacer Acción de Seguimiento)	X	Salvador Alvarez	571769	30-Jun-25
4	Actualizar Listado Maestro de MOC en compartido EHS	X	Aprobador EHS:		30-Jun-25
5	El contacto Jabil es responsable de solicitar los permisos derivados del presente MOC al momento de realizar el cambio y/o actividades. Al finalizar se deben regresar los permisos con las firmas del contacto y la aprobación de EHS	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
6	Información a personal de producción	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
7	Acordonado del area a trabajar	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
8	Asegurar de no obstruir tableros electricos, extintores, raiser, salidas de emergencia, rutas de evacuacion, señalamientos de seguridad, detectores de humo, aspersores contra incendios, alarmas de emergencia.	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
9	Solicitar liberacion de permisos (analisis de riesgo extraordinario, permisos de altura, corte y soldadura, electrico, etc) antes del inicio de la actividad (trabajo), portando el equipo de proteccion personal (EPP), ademas de contar con las certificaciones requeridas.	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
10	Asegurar acordonamiento, antes, durante y despues de tareas	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
11	Actualizar RA en base a ejecución de tareas	X	Salvador Alvarez		30-Jun-25
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

EQUIPOS Y PROCESOS (APLICA LLENAR SI SE CONTESTO "SI" A LA PRIMER PREGUNTA EN LA CARATULA DEL MOC

Protección / Guardas

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El equipo o equipos involucrados en el MOC tienen guardas de máquina que cumplan con todos los requisitos?	X		
¿Todas las partes móviles, correas de movimiento, poleas de engranajes o sprockets están cubiertos para evitar lesiones?	X		
¿Se han cubierto con guardas todos los puntos de pincho, mordisco y/o corte?			X
Para cualquier punto de pincho, mordisco y/o corte que no esté protegido, ¿están etiquetados e identificado el riesgo?			X
¿El equipo tiene bordes afilados o ásperos que podrían causar lesiones ya protegidos con guardas?	X		
¿Se ha diseñado el entorno de trabajo para eliminar los riesgos de resbalones, tropiezos y caídas?	X		
¿Riesgos de proyección o por encima de la cabeza están adecuadamente controlados?	X		
¿Se utiliza material de construcción apropiado para compatibilidad de la maquinaria o evitar corrosión?	X		
¿Están bien protegidas las minillas de proceso, los indicadores de flujo, los medidores, manómetros, válvulas, etc.?			X
¿El equipo está diseñado para minimizar el potencial de riesgos de vibración por su funcionamiento?			X

Control de la Energía (LO/TO)

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El equipo o equipos cumplen con los requisitos de paro de emergencia?	X		X
¿El paro de emergencia tiene prioridad sobre todas las demás funciones y secuencias de operación?			X
¿Se han tomado medidas para garantizar que los dispositivos necesarios para liberar a las personas atrapadas no se vean obstaculizados al activar el paro de emergencia?			X
¿Se ha eliminado efectivamente algún riesgo de confusión entre los dispositivos de paro de emergencia activos y no activos?			X
¿Se han tomado medidas para garantizar que otras funciones de seguridad no se vean afectadas negativamente por el paro de emergencia (por ejemplo, frenos, mandriles mecánicos o partes rotativas)?			X
¿Se detienen todos los movimientos peligrosos como resultado de la función de paro de emergencia y se detiene la máquina sin causar ningún peligro adicional (¿Qué categoría de paro de emergencia es? ¿Funciona?)?			X
¿El paro de emergencia está diseñado para que la operación del paro de emergencia no requiera ninguna deliberación por parte del individuo con respecto al efecto del paro?			X
¿La categoría de paro del Paro de Emergencia instalado cumple y está alineado con la evaluación de riesgos de la máquina (MRA)?			X
¿Existe una Función de Reinicio provista en cada paro de emergencia (desconexión) y la operación de reinicio solo se puede llevar a cabo en el lugar donde está ubicado el Paro de Emergencia?			X
¿Se ha garantizado que, una vez reiniciado el paro de emergencia, la máquina solo se pueda volver a poner en funcionamiento de forma manual y no automática?			X
¿Los componentes de la función de paro de emergencia están diseñados teniendo en cuenta los factores de influencia del ambiente para anticiparlos (como por ejemplo un proceso que genere residuo y dañe poco a poco el paro de emergencia)?			X
¿El botón de paro de emergencia (tipo honco, rombo, etc. color rojo) es fácil de operar? (al alcance del operador y NO obstruido)			X
¿Hay un Paro de emergencia instalado en cada consola de controles del equipo (s) y de fácil acceso?			X
¿La ubicación de los controles de los equipos tienen en cuenta la ergonomía y la visibilidad?			X
¿Están todos los mecanismos de corte eléctricos claramente marcados y accesibles? (El Main breaker de un tablero)			X
¿El equipo (s) tiene puntos de bloqueo según corresponda (eléctrico, hidráulico, de gravedad, mecánico, neumático)?			X
¿El equipo (s) cuentan con el procedimiento específico Placard e incluye la eliminación de toda la energía almacenada?			X

Espacios Confinados

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Al equipo o proceso le aplica y cumple la definición de espacio confinado? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
¿Tiene el sitio un programa de espacio confinado (inventario, procedimiento, etc.)?			
¿El sitio permite que los empleados entren en espacios confinados?			
¿El sitio tiene un entrenamiento en espacios confinados?			

Protección Contra Caídas

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Este cambio agrega alguna tarea que requiera un trabajo en alturas? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
¿El sitio tiene un procedimiento de protección contra caídas?			
¿El sitio tiene EPP de protección contra caídas?			

Protección / Sistema Contra Incendios (SCI) y Salidas de Emergencia

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proceso posee materiales combustibles y/o inflamables? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
¿El sistema contra incendio fue diseñado por un profesional en diseño de sistemas inflamables? (Revisar con Facilities)			
¿Se instaló el sistema en un lugar clasificado para manejo de incendios?			
¿Cumple el sistema con todos los códigos locales de incendios? (NOM-002-STPS, Prot. Civil, etc.)			
¿El sistema cumple con todos los requisitos de FM Global? (Revisar con Facilities)			
¿El diseño del sistema incluye un apagado automático?			
¿El sistema tiene equipos a prueba de explosión?			
¿El sistema tiene monitores de Límite Inferior de Explosión (LEL)?			
¿El sistema tiene alarmas para monitorear el 10% de LEL?			
¿Tiene el sistema contra incendio un sistema de energía de respaldo en caso de falla de energía? (Revisar con Facilities)			
¿El cambio agrega nuevos trabajos o procesos calientes que deban ser controlados?			
¿El cambio incluye algún riesgo de explosión y esta controlado? (Procedimiento de Polvos Combustibles)			
¿El SCI actual y/o sistema de supresión de incendios son adecuados para este nuevo cambio?			
¿El cambio afecta las ubicaciones de los extintores contra incendios y ya están reubicados correctamente de acuerdo a NOM-002-STPS?			
¿El cambio afecta a las estaciones de primeros auxilios o se requiere modificar algún servicio médico?			
¿El cambio afecta la necesidad de tener estaciones de lavado de ojos y/o ducha?			
¿Los subproductos de un proceso de combustión incompleta generado por este cambio han sido revisados y controlados?			
¿Se revisaron si con el cambio existen Productos químicos incompatibles y ya se controlaron / separaron?			
¿El sitio requiere un generador de emergencia / fuente de poder / UPS por el cambio?			

Consideraciones de Presión/Vacío - Recipientes Sujetos a Presión (RSP) - NOM-020-STPS

Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿La presión de trabajo máxima permitida del equipo es adecuada para el servicio previsto?			X
¿Es adecuada la capacidad de la válvula de alivio de manera que no se pueda producir una sobrepresión por alteraciones del proceso, fallas de válvulas o tubos, incendios, pérdida de servicios o líneas bloqueadas (expansión térmica)?			X
¿Se ha tenido en cuenta la contrapresión debida a las tuberías de descarga o los cabezales de ventilación al dimensionar y configurar los dispositivos de alivio de presión?			X
¿Se ha revisado la correcta capacidad de alivio de presión para bombas de desplazamiento positivo?			X
¿Las descargas de dispositivos de alivio están dirigidos en dirección contraria a la del personal?			X
¿La tubería de las descargas de alivio están adecuadamente sujetas para evitar romperse contra las fuerzas de reacción?			X
¿Se han proporcionado agujeros de drenaje o drenales en las tuberías de descarga de los dispositivos de alivio de presión?			X
¿Se ha abordado adecuadamente el potencial para el bloqueo del dispositivo de alivio?			X
¿Se ha abordado el potencial de vacío repentino por enfriamiento o condensación?			X
¿Se ha revisado por Ingenierías o un consultor el tamaño y la configuración de todos los dispositivos de alivio de presión o vacío?			X
¿Se han ingresado nuevas válvulas de seguridad y discos de ruptura en el programa de MP y se han eliminado obsoletos?			X

Energía Radiante / Ruido			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El cambio NO incluye ruido de 85dB o superior?	X		
¿Algún equipo, maquinaria o proceso del cambio NO incluye radiación ionizante (partículas, ultravioleta, rayos X o rayos gamma)?	X		
¿Algún equipo, maquinaria o proceso del cambio NO tiene radiación no ionizante (láser)?	X		
Críticos para la vida y Respuesta a Emergencias			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El cambio NO afecta elementos críticos para la vida como escaleras, calderas, transformadores, tableros, etc.?	X		
¿Las escaleras, escalones y pasamanos cumplen con las normas locales como STPS y las del estándar Global (procedimientos locales aplicables)?			X
¿Las escaleras incluidas en el cambio de más de 12 pies (3.6 metros) cuentan con una laula de seguridad?			X
¿Las escaleras móviles o fijas incluidas en el cambio de más de 4 pies (1.2 m) de altura tienen pasamanos?			X
¿Las escaleras incluidas en el cambio de más de 30 pies (9 m) de altura tienen un descanso a la mitad de ellas?			X
¿La escalera fija incluida en el cambio con puerta abatible. NO tiene riesgo de golpe? (Es mejor puerta sobre escalera, en vez de puerta en laula).			
¿Se ha completado el análisis de riesgos (RA) del área y tareas contemplando que exista una falla de equipo (s)?	X		
¿Todas las salidas de emergencia y ordinarias cumplen con los requisitos locales estando claramente marcadas? (NOM-001, 002 & 026-STPS)	X		
¿Toda escalera con descansos cuenta con rodapiés de mínimo 15 cm?			X
¿Toda escalera que requiera control de acceso utiliza puerta vertical en vez de escobilla?			X
¿Toda escalera que incluya el cambio (consulte el Código de calderas ASTM)?			X
¿Están instaladas correctamente las líneas de vapor o de calderas que incluya el cambio (consulte el Código de calderas ASTM)?			X
¿Las líneas de aire comprimido están diseñadas e instaladas correctamente? (Si se usan manualmente, están a max. 30 PSI)			X
¿Están bloqueadas todas las aberturas no utilizadas en los tableros eléctricos?			X
¿Todos las pastillas/interruptores de tableros eléctricos están etiquetados con la ubicación del servicio y el equipo servido?			X
¿El equipo está controlado y con licencia / permiso del gobierno local? Ejemplo: Hay equipos especiales que requieren licencia/permiso del gobierno local como compresores de aire (RSP); Máquina de rayos X, etc.			X
Químicos/Materia prima/Subproducto de procesos			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proceso/equipo incluido en el cambio utiliza material tóxico y peligroso? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
Si el proceso maneja contaminantes en el aire ¿son controlados adecuadamente?			
Si el proceso maneja carcinógenos ¿son controlados adecuadamente?			
Si el proceso maneja agentes sensibilizante (reacciones alérgicas) ¿son controlados adecuadamente?			
Si el proceso maneja químicos corrosivos ¿son controlados adecuadamente?			
Si el proceso maneja químicos en contacto con materiales incompatibles ¿son controlados adecuadamente?			
¿Tiene el sitio un proceso para eliminar los desechos peligrosos generados por este cambio?			
¿Se ha controlado adecuadamente el potencial de acumulación de electricidad estática?			
Temperatura			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proceso/equipo incluido en el cambio tiene riesgo de alta temperatura (mayor a 130°F (54°C))?. De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
¿El área de trabajo está adecuadamente ventilada?			
¿Se ha diseñado el sistema / layout para eliminar la exposición de los empleados a superficies calientes?			
¿Se han aislado las áreas calientes (por encima de 130°F (54°C))?			
Si no existen controles de Ingeniería para eliminar la exposición de los empleados, ¿se han proporcionado instrucciones de trabajo, capacitación y EPP a todos los empleados que trabajan cerca del área caliente?			
¿La separación a las superficies calientes cumple con todos los requerimientos legales contra incendio? (NOM-002-STPS u otras)			
¿Las superficies calientes están etiquetadas con etiquetas de advertencia calientes?			
Electricidad			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El diseño del equipo cumple con todos los requisitos de seguridad eléctrica que soliciten los estándares y leyes aplicables?			X
¿El equipo está diseñado para evitar arco eléctrico hacia los empleados de los alrededores?			X
¿El equipo disipa la electrostática?			X
¿El equipo maneja baja tensión/voltaje?	X		
¿El equipo eléctrico especifica adecuadamente la clasificación de peligro eléctrico del área?	X		
¿El equipo eléctrico cumple con los criterios del Departamento de Ingeniería (Facilities, IE, ME, TE o Aut.) para el uso de la planta?			X
¿Se han actualizado los esquemas, el cableado, diagramas y/o los dibujos de una sola línea para reflejar los cambios?			X
¿Se ha especificado una conexión a tierra adecuada de todos los equipos eléctricos y de proceso?			X
¿Se especificaron los procedimientos de conexión y prueba de modo que la rotación y el sincronismo eléctrico se pueda verificar en el campo?			X
¿Se han etiquetado correctamente los interruptores de On / Off y otros interruptores eléctricos?			X
¿Se pueden aislar los equipos eléctricos de seguridad para trabajos de reparación? ¿Existen conexiones de bloqueo (LOTO) tanto en mecanismos de energía secundarios como en el interruptor On / Off?			X
¿Se han sellado todos las uniones en tubería Conduit?			X
¿Se han calibrado los relevadores de protección eléctrica y los dispositivos de seguridad y reportado al departamento de Calibración (Si Aplica)?			X
Iluminación			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿La iluminación es la adecuada para toda el área del cambio? (por ejemplo: falta de iluminación de emergencia, de respaldo, problemas de deslumbramiento o falta de Luxes?	X		
Superficies para Caminar y Trabajar			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proceso/equipo incluido en el cambio generan problemas de resbalones, tropiezos y caídas, problemas de espacios libres y pendientes que afectan a los empleados? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.	X		
¿El área de equipos y procesos está diseñada y construida de tal manera que permita un fácil acceso y salida para la operación, mantenimiento y otras tareas comunes?	X		
¿El área tiene pasillos formales designados?	X		X
¿El área tiene barreras protectoras?	X		
¿Están las superficies para caminar y trabajar niveladas, debidamente aseguradas y no resbaladizas?	X		X
¿Se han cumplido los requisitos de trabajo en superficies elevadas o de altura?			
Grúas aéreas y/o equipos de elevación			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proceso/equipo incluido en el cambio agrega grúas y / o equipos de elevación? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.			X
¿La grúa/equipo de elevación incluido en el cambio cumple con los requisitos estructurales del edificio? (Confirmar con Facilities)			
¿La grúa/equipo de elevación incluido en el cambio cuenta con etiquetas para los límites de carga de la grúa?			
Construcción / Re-diseño			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El proyecto/cambio incluye alguna parte que implique la construcción o el rediseño de un área de trabajo? De lo contrario, ingrese NA y omita esta sección.	X		
¿Si este trabajo afecta o cambia los servicios subterráneos del sitio han sido debidamente controlados?			X
¿Si este trabajo afecta o cambia cableado eléctrico del sitio han sido debidamente controlados?			X
¿Si este trabajo afecta o cambia áreas donde hay o podría haber asbesto, han sido debidamente controlados?			X
¿Si este trabajo afecta áreas con elementos estructurales podridos o deteriorados, han sido debidamente controlados?			X
¿Si este trabajo afecta o cambia líneas de gas del sitio han sido debidamente controlados?	X		
¿Tiene el proyecto un proceso para gestionar los peligros descubiertos no analizados durante la ejecución del cambio?	X		
¿Tiene el proyecto un proceso para gestionar la falta de dibujo(s) o inexacto(s) durante la ejecución?	X		

Válvulas y Tuberías (Revisar con Facilites en caso de ser parte del proceso de Servicios o Ingenierías para tuberías de equipos)			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Se ha verificado la correcta instalación y orientación de todas las válvulas (proceso, instrumentación, servicios, etc.) (incluida la orientación de las válvulas de control y las válvulas de retención)?			X
¿Se han revisado las líneas cruzadas o combinadas con bypass (cabezales de bomba, líneas de servicios, tipo araña, etc.) para minimizar el potencial de contaminación y eliminar la mezcla de productos químicos reactivos?			X
¿Se ha hecho una debida inspección de las válvulas, bridas y mirillas para garantizar una clasificación de presión adecuada y compatibilidad?			X
¿Toda Brida ha sido inspeccionada para asegurar juntas adecuadas, pernos apretados (Prueba de Fugas) y orificios de restricción?			X
¿Todos los tubos y accesorios de tubos (coples, nipples, etc.) han sido inspeccionados para evitar fugas ni ajustes inadecuados?			X
¿Todas las válvulas a prueba de fallas actúan de manera adecuada (falla al abrir, falla al cerrar, falla sin cambios); y se aprobó su ubicación?			X
¿Todas las válvulas y de bloqueo han sido lubricadas y manipuladas para garantizar un funcionamiento adecuado, así como un ajuste de embalaje necesario?			X
¿Las válvulas de bloqueo abierto y bloqueo cerrado han sido inspeccionadas y están debidamente aseguradas en su posición prevista, y verificadas contra la documentación?			X
¿Todas las líneas y equipos están debidamente etiquetados / identificados?			X
¿Se ha confirmado que todas las derivaciones (bypass) de tuberías están en la posición requerida?			X
¿Reillas de ventilación, desagues y puntos de muestreo están ubicados y configurados para un uso seguro?			X
¿Se hizo inspección de mangueras de servicios, que tengan accesorios adecuados, purgas y válvulas de retención?			X
¿Todos los filtros y reillas (temporales o permanentes) están ubicados e instalados correctamente?			X
¿Las válvulas de alivio y los discos de ruptura están instalados correctamente y en un estado funcional?			X
¿Se han evitado los cruces entre los sistemas de tubería de alta y baja presión?			X
¿Se proporcionan respiraderos y drenajes adecuados para cuando se realicen los bloqueos y el mantenimiento?			X
¿Se han eliminado las ramificaciones de tuberías no utilizadas generados durante el cambio?			X
¿Se colocaron durante el cambio los arreglos de tuberías de manera obvia de tal forma que se evite potencial de confusión entre ellas?			X
¿Se han utilizado las especificaciones y características adecuadas de válvula y tubería?			X
¿Se tomaron en cuenta procedimientos especiales de fabricación / montaje para las tuberías?			X
¿Se ha considerado la tensión o vibración potencial y se ha analizado / controlado a detalle?			X
¿Se utiliza el material, juntas y bridas adecuadas para las tuberías específicas que manejan químicos?			X
¿Se ha controlado adecuadamente el potencial de polimerización o taponamiento de tuberías?			X
¿Están los soportes de tubería adecuadamente especificados e instalados?			X
¿Están los respiraderos y desagues ubicados de tal manera que no creen un peligro para el personal?			X
¿Se ha especificado la correcta tuerca o material de ajuste para el tipo de brida que se utiliza?			X
¿Se han especificado y completado los métodos de prueba adecuados para garantizar la integridad de los sistemas de tuberías nuevos o revisados (es decir, Pruebas hidrostáticas, Mediciones de presión, Espesor de metal, etc.)?			X
¿Los puntos de muestreo están configurados correctamente para hacerlo de manera segura?			X
¿Se cuenta con un acceso seguro a las válvulas?			X
¿Las mangueras son del tipo adecuado para el proceso?			X
¿Se tiene una prevención adecuada del flujo de retorno (válvulas check u otras)?			X
¿Se han minimizado las longitudes de los nipples y las conexiones olet?			X
¿Se ha proporcionado continuidad eléctrica y conexión a tierra?			X
¿Se han instalado las tuberías exactamente como se especifica? ¿Se ha realizado una revisión línea por línea?			X
¿Las válvulas abiertas son del tipo aprobado (p. Ej., Manija con bloqueo, válvulas de compuerta, etc.)?			X
¿Se cumple el correcto código de colores de tubería, el etiquetado de línea y la indicación de flujo donde sea necesario? (NOM-026-STPS)			X
CONSIDERACIONES DE EQUIPO ROTATIVO Y MECÁNICO (BOMBAS) / GRUAS / POLIPASTOS			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Se han especificado las instrucciones de trabajo (WI)/procedimientos operativos estándar (SOP) para una operación segura?			X
¿Se han seleccionado correctamente los lubricantes y otros químicos utilizados de modo que una fuga en el proceso no provoque reacciones químicas no deseadas o contaminación del producto?			X
¿Si se han introdujeron nuevos lubricantes u otros químicos utilizados ya se aprobaron las hojas de datos de seguridad (HDS)?			X
¿Si aplica y hay componentes húmedos en el proceso, son de un material apropiado de construcción?			X
¿Se tiene una línea de recirculación si es necesario mantener un flujo mínimo para este cambio?			X
¿Se aseguró evitar el potencial de punto muerto en las bombas incluidas en el proceso? (una bomba funcionando sin flujo por bloqueo)			X
¿Se aseguraron medidas para evitar fallas de potencial de sello de bombas?			X
¿Se han tomado medidas para prevenir la cavitación y para evitar daños en caso de que ocurran?			X
¿Se han proporcionado y probado sistemas de apagado de emergencia u otros dispositivos de protección? ¿O se ha mantenido la función de los existentes?			X
¿Se cuentan con guardas de equipo adecuadas?			X
¿Existen métodos correctos para realizar limpieza, aislamiento y bloqueo de los equipos y su mantenimiento y/o preforme?			X
¿Se tiene programado un correcto mantenimiento preventivo (PM)?			X
¿Se tiene código de colores o marcado de otra manera los tubos para garantizar una conexión correcta después del mantenimiento?			X
¿Las capacidades de los equipos de elevación, pisos y polipastos están debidamente etiquetadas y son visibles para el operador?			X
¿Todos los sistemas de lubricación están en servicio y los rodamientos se lubrican según las especificaciones del fabricante?			X
El equipo mecánico cuenta con una correcta alineación y rotación adecuadas: ¿Se han realizado comprobaciones funcionales en equipos y controles?			X
Los puntos de disparo del equipo giratorio, especialmente errores por sobrevelocidad, ¿se han verificado y probado para evitar riesgos?			X
¿Se han instalado todas las guardas / dispositivos de seguridad del equipo?			X
¿El equipo tiene un diseño adecuado para drenaje, limpieza, aislamiento, bloqueo, verificación de despresurización y acceso / retiro de equipos para realizar el mantenimiento?			X
¿Sistema de monitoreo de vibración en modo listo en caso de aplicar en el equipo?			X
Diseño de Procesos			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Los cambios o desviaciones del proceso están de acuerdo a los límites de diseño operativo?			X
¿Los cambios o desviaciones del equipo de proceso cumplen con las especificaciones de seguridad?			X
¿Los cambios o desviaciones en la composición o el uso de sustancias químicas están alineados a los requerimientos?			X
¿Los cambios o desviaciones al diseño del proceso o de la instalación, incluyendo los planos (layout) ya está cumpliendo requerimientos EHS?			X
¿Los cambios o desviaciones de uso de equipo de Facilities como Unidades Paquete, tableros u otros, cumplen con el MOC en cuestión?			X
¿Cualquier cambio de materiales están documentados en los procedimientos, WI o AV aplicables?			X
Instrumentación y Control			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Los suministros de aire a los transmisores y/o válvulas de control se verifican y confirman que están abiertos?			X
¿Comprobaciones de ciclo completadas (cualquier instrumento nuevo controlado)?			X
¿Todas las cubiertas de instrumentos/paneles están colocadas correctamente?			X
¿Todos los instrumentos de válvulas están correctamente alineados con tapones de ventilación en su lugar?			X
¿Activadores de alarma cargados en la consola o programa del equipo?			X
¿El equipo (si aplica) cuenta con una consola dedicada disponible para monitorear sistemas secundarios y recibir / mostrar alarmas?			X
¿Instrumentos calibrados?			X
¿Instrumentos a prueba de clima, agua, calor, etc. dependiendo la necesidad?			X
¿Se han verificado todos los puntos de ajuste de alarma, apagado y alivio?			X
¿Todos los instrumentos críticos y su lógica asociada han sido calibrados/verificados?			X
¿Se han verificado las acciones a prueba de fallos de equipos aplicables?	X		
Barreras (Si aplica)			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Todos los recipientes se encuentran correctamente cerrados?			X
¿Tuberías que incluyen válvulas de drenaje se encuentran correctamente cerradas?			X
¿Todos los puntos de muestreo se encuentran cerrados?			X
¿Sifones se encuentran llenos?			X
¿Todas las persianas de construcción se retiraron según sea necesario? ¿Todas las persianas permanentes están en su lugar?; ¿Se han eliminado todas las persianas temporales? ¿La lista de persianas ha sido revisada y aprobada?			X
¿El volumen del pozo de captación de aguas residuales de la PTAR es suficiente?			X
¿El sistema de emisiones al aire se encuentra en óptimas condiciones?			X

Servicios para el cambio propuesto			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Niveles de vapor y presión disponibles son los suficientes?			X
¿Presión/temperatura/disponibilidad de agua de enfriamiento/salmuera son suficientes?			X
¿Aire acondicionado disponible?			X
¿Instrumento de control de aire está disponible?			X
¿Nitrogeno disponible?			X
¿Fuente de alimentación suficientes? (asegurar # de bajadas correctas, los multiples están prohibidos, solamente para equipo de computo)			X
¿Servicio de gas natural o LP se encuentra disponible?			X
¿Algún otro servicio se encuentra listo en caso de ser necesario?			X
Instalaciones de Seguridad de los equipos incluidos en el cambio			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Interlocks de seguridad se encuentran activados?			X
¿Interlocks mecánicos se encuentran funcionando?			X
¿Los sistemas de ventilación relevantes para la seguridad funcionan?	X		
¿Se han eliminado todas las derivaciones y/o puentes (bypass) en los circuitos de control o seguridad?	X		
¿Se han instalado señales de seguridad (ejemplo: superficie caliente, paro de emergencia en español, EPP, señales de guardas, riesgos, etc.)?			X
¿Existe conexión a tierra y conexión equipotencial?			X
¿Existe medidas de pararrayos en el edificio?			X
Plataformas, zócalos, escaleras, escalones, jaulas, etc. instalados correctamente y con Capacidad adecuada para salir de plataformas.			
Gestión de Emergencias			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿Plan de acción o respuesta de emergencia actualizado y personal capacitado?	X		
¿Detectores de gas disponibles si aplican?			X
¿Absorbentes suficientes y adecuados para fugas masivas disponibles? (kits antiderrame)			X
¿Se han instalado y funcionan las instalaciones de sistema contra incendios (por ejemplo, alarma, extintor de incendios, monitor de incendios, etc.)?			X
¿Ducha de seguridad (si aplica) y lavajos disponibles y funcionales?			X
¿Ruta de evacuación de emergencia y punto de reunión comunicados?			X
¿Brigada contra incendios / primeros auxilios / evacuación disponible?			X
Comunicación de emergencia disponible? (sistema de transmisión o radios disponibles)			X
¿Ropa de protección química disponible?			X
¿Máscaras de protección respiratoria disponibles? ¿Hay suficientes botellas de aire disponibles?			
Seguridad en el Trabajo			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿EPP necesario disponible para la operación?	X		
¿Guardas contra salpicaduras revisadas y en óptimas condiciones?			X
¿Las rellenas están instaladas y se encuentran en óptimo estado?			X
¿Andamios desmantelados que no están en uso?	X		
¿Las condiciones de orden y limpieza están en cumplimiento? (Estandar 5's de Lean / Manufactura)	X		
¿Solo hay personal autorizado en el área del cambio?		X	
¿Todos los contratistas están informados sobre el cambio de las reglas de seguridad al inicio de operaciones?			X
¿Los permisos de trabajo en caliente, trabajos en altura y espacios confinados fueron archivados al finalizar la actividad del cambio?			
Controlador Lógico Programable (PLC) - Está última sección a llenar se realiza SOLO si se contestó la Pregunta 6 "SI" en la carátula o pestaña "Aviso Cambio"			
Si alguna de las respuestas a continuación es NO o no conoce la respuesta a alguna pregunta, se debe complementar a través de una Evaluación de Riesgos (RA), una Evaluación de Riesgos de Maquinaria (MRA) u otro formato que designe EHS	SÍ	NO	N/A
¿El equipo tiene PLC? Si es así, complete las siguientes preguntas. De lo contrario, conteste NO y N/A para omitir esta sección.			X
¿El equipo tiene una programación de seguridad adecuada para todas las tareas que realiza o ejecuta?			
¿La programación de seguridad tiene un método para el control de acceso (clave o código)?			
¿Tiene el sitio un método para controlar el acceso a la programación de seguridad del equipo o máquinas involucradas en el cambio?			
¿Se han especificado e instalado correctamente la posición de seguridad de las válvulas o actuadores para minimizar riesgo en caso de falla?			
¿Se han conservado los sistemas de apagado y dispositivos de seguridad del equipo (s) existentes?			
¿Se ha verificado adecuadamente el potencial de interacción con los controles existentes para reducir cualquier riesgo?			
¿Los equipos cuentan con alarmas cuando es necesario y se evitan cuando no es necesario?			
¿Se pueden aislar y limpiar adecuadamente las válvulas automáticas para su mantenimiento o extracción?			
¿Se han energizado los controles y las alarmas de manera segura permitiendo un reset?			
¿Se ha probado el software nuevo o revisado?			
¿Se ha probado el hardware nuevo o revisado?			
¿Se han hecho copias de seguridad del software y se mantienen por separado?			
¿Se han actualizado las pantallas del equipo o máquina?			
¿La última revisión del software ha sido revisado por un contratista independiente que lo valide?			
¿Se han hecho provisiones en el software a prueba de fallas?			
¿Se han guardado las revisiones de software en el disco duro?			
¿Se han identificado y creado nuevas instrucciones críticas que sirvan como salvaguarda y/o se han ingresado en el programa de MP?			

Fecha de aprobación:		Embarques a Cuarto Limpio John Deere 201		Contemple los riesgos:	
Áreas(s) de trabajo:				Normales	
Compañía que trabaja:		Movimiento e instalación estaciones Gecdo desde almacén al cuarto limpio de John Deere en la línea 201		Anormales	
Descripción de la tarea:				No rutinaria	
Contacto Jabli:		Salvador Alvarez		Ataque	
Contacto Jabli es responsable del cumplimiento de los requerimientos de seguridad, estar disponible personalmente o asignar a un delegado para atender las necesidades que del trabajo, incluyendo la investigación de incidentes		5402		Desarrollo	
Responsable		Anude el número de MOC autorizado por EHS y tenga una copia en el área		Emergencia	
Tipo(s) De Tarea(s) A Realizar		MOC #			

Plan de trabajo	Riesgos	Exposición n	Severidad d	Probabilidad ad	Riesgo = E*S*P	Controles	Controles	RS	Porcentaje De Reducción De Riesgos
1.- Recepción de material	Tropiezo de personal, golpe en alguna superficie del material, choque con carrito de materiales, babedero, operadores. Cruce en áreas delimitadas por trabajos ajenos	2	3	2	12	Delimitación en área de embarques. Notificaciones a líneas de equipo. Zapato y guantes de seguridad	2	1	-95%
2.- Se trasladan Equipos por medio de mulas	Tropiezo del personal con pallet, golpe del operador en alguna superficie del material	2	3	2	12	Notificaciones a líneas de equipo trasladándose. Zapato y guantes de seguridad	2	1	-95%
3.- Se acciona zona y se descargan maquinas en área designada	Golpe con estructura. Atrapamiento con estructura. Tropiezo con estructura. Corte con estructura	2	3	2	12	Delimitación en área. Zapato y guantes de seguridad	2	1	-95%
4.- Instalación de estructura. Una vez descargado todo, se conectan los equipos para validar conexión	Golpe con estructura. Atrapamiento con estructura. Tropiezo con estructura. Corte con estructura	2	3	2	12	Delimitación en área. Notificaciones a equipo de trabajo. Zapato y guantes de seguridad	2	1	-95%
5.- Validación de trabajo. Se valida que estructura este en correcto estado y no tenga daños por movimientos	Tropiezo y golpe contra el equipo	2	2	2	8	Delimitación en área. Zapato y guantes de seguridad	2	0,4	-95%
6.-					0			0	0%
7.-					0			0	0%
8.-					0			0	0%
9.-					0			0	0%
10.-					0			0	0%
11.-					0			0	0%
12.-					0			0	0%
13.-					0			0	0%
14.-					0			0	0%
15.-					0			0	0%

EPP requerido




☐ Guantes anti-corte	☒ Zapato de seguridad	☐ Caso	☐ Arc Flash	☐ Gorra de seguridad
☐ Guantes de camaza 3/4	☐ Zapato dieléctrico	☐ Respirador	☐ Tapete dieléctrico	☐ Lentes con protección UV
☐ Guantes eléctricos	☐ Careta	☐ Protección auditiva	☐ Prohibición de equipo ESD	☐ Cubre lentes
☒ Guantes de nitrilo	☒ Peto/Camaza	☐ Protección respiratoria	☐ Zapato de seguridad con suela antiderrapante	☐ Equipo autónomo
☐ Guantes para altas temperaturas	☐ Lentes de seguridad	☐ Polvo	☐ Guante de neopreno	☐ Cubrebocas
☐ Guantes doble cero	☐ Guante descubierta tres dedos	☐ Mangas de camaza	☐ Ropa con antiefranjeante preventivo	
☐ Guantes piel de cabra		☐ Arnés		

Nombre y firma del responsable de la actividad (Superior Contratista). Me aseguro de cumplir y mantener con todo lo establecido en este permiso.	El responsable de actividad y EHS aprueban actividades de bajo y medio riesgo. Si hay riesgos altos, debe estar involucrando el Gerente Impactado del área y los Ingenieros EHS.		Plan de emergencia		Auditoría de seguridad por contacto Jabli.	
Nombre y firma de participantes del trabajo. Al firmar me comprometo a cumplir con todo lo requerido en este permiso			Teléfono de responsable de actividad		Es necesario suspender el trabajo hasta una corrección por la siguiente razón: () No consideración de actividades en plan de trabajo () No seguimiento de los controles definidos () Riesgos de lesión inminentes () Otros(s): _____ Nombre, firma y fecha: _____	
	1.-	Firma de autorización de contacto Jabli.	Número de emergencia Jabli	1111	Revisión de puentes según el plan de trabajo.	Herr. Inicial (Llena EHS):
	2.-	Me hago responsable de garantizar durante todo el tiempo que tome las actividades aquí descritas el cumplimiento de los controles establecidos en este permiso.	Teléfono de contacto Jabli		Área acordonada efectivamente.	Llena contacto Jabli
	3.-		Teléfono de EHS (que opere)		Equipo de protección personal (EPP) en uso y en buen estado.	1ra
	4.-	Nombre y firma de autorización de representante EHS			Guardas y conexiones en óptimas condiciones.	2da
5.-			1 - En caso de emergencia médica, siempre contacta a servicio médico (1111).	Ventilación, polvos y ruido controlados.	3ra	
6.-	Autorización por Gerente (SI APLICA)		2 - En caso de incendio, alarma o desastres, siga su ruta de evacuación del área.	Químicos identificados.		
7.-			3 - En caso de evacuar, siga las indicaciones de los coordinadores de emergencia.	Material y/o herramienta ordenado y en óptimas condiciones.		
8.-				Asegurar libranza.		
9.-				Únicamente personal autorizado en el área.		
10.-				Vigía siempre presente.		
11.-			4 - Notifique al responsable de la actividad, contacto Jabli y EHS para posterior ayuda.	No sobrepasar el 1.80m en escalera.		
			Firma de verificación de condiciones seguras:			


46	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación Tarea Operar de	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	1	2	20	Asistencia Visual	Guantes Lentes	No	N/A	Salvador Alvarez	4	17	15%	SI
47	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Revisar material de trabajo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	1	1	10	Asistencia Visual	Guantes Lentes	No	N/A	Salvador Alvarez	4	9	15%	SI
48	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Descarga Eléctrica	Electricidad	Negativo	Normal	No aplica	2	3	2	60	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	9	85%	SI
49	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	3	3	2	90	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	14	85%	SI
50	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	No rutinario	No aplica	2	3	2	60	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	9	85%	SI
51	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	1	1	10	Asistencia Visual	Guantes Lentes	No	N/A	Salvador Alvarez	4	9	15%	SI
52	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	3	2	60	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	9	85%	SI
53	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	4	2	80	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	12	85%	SI
54	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	2	1	1	10	Asistencia Visual	Guantes Lentes	No	N/A	Salvador Alvarez	4	9	15%	SI
55	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Descarga Eléctrica	Electricidad	Negativo	Normal	No aplica	2	3	2	60	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	9	85%	SI
56	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	Normal	No aplica	3	3	2	90	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	14	85%	SI
57	H&S	STB Operación del equipo de trabajo	Operación del Equipo	Corrección de la alarma	Grupos	Negativo	No rutinario	No aplica	2	3	2	60	Asistencia Visual	Guantes Lentes	SI	N/A	Salvador Alvarez	3	9	85%	SI

Área de
Embarques

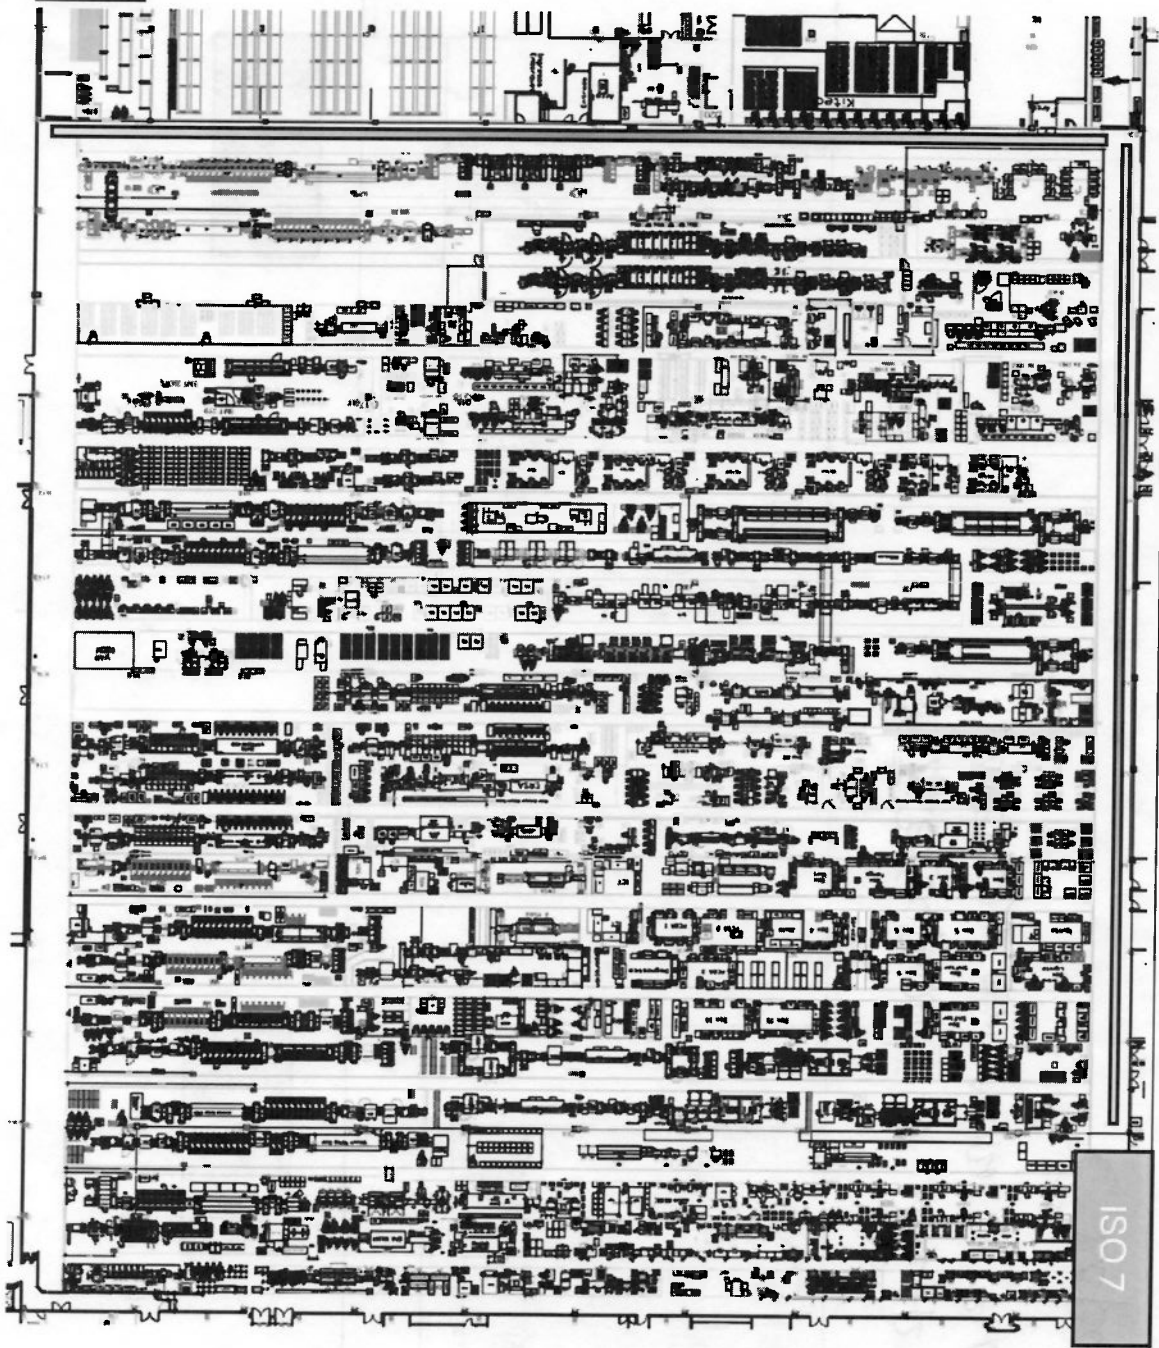


ISO 7

ISO7
Antes

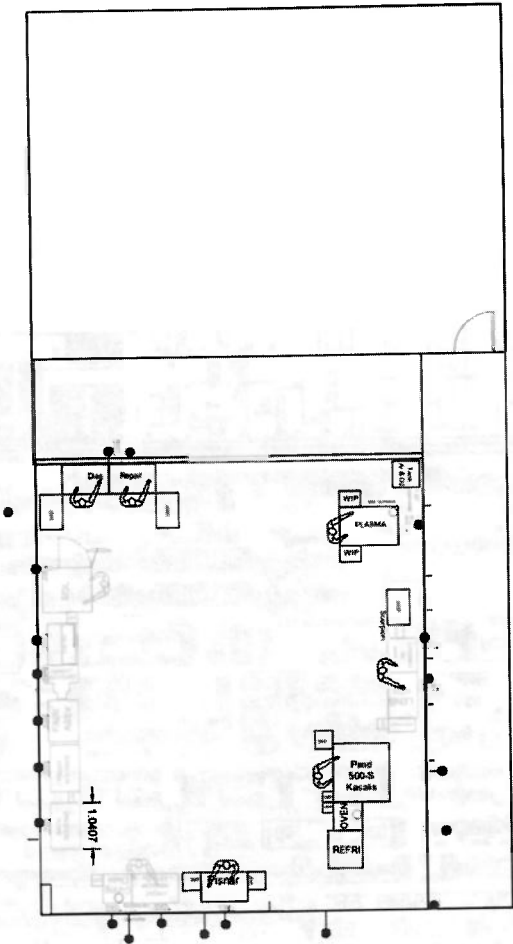

ISO7
Despues

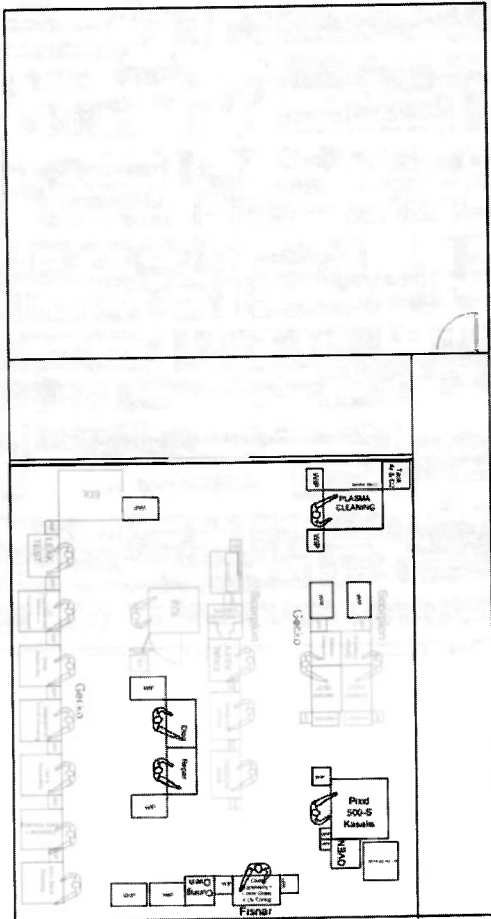

* DESGLOPAMIENTO DE SEUAP CONJUNTO
DETRAPA EN MUROS Y PUEROS.


○ Despejado.

16-PE80-6500-00023 F / 16-PE30-6500-00023

North/Nord	Linea No./Linea No.	Rev.
	Linea 201	A
Proyecto/Proyecto: John Deere		
Owner/Dueño: Angel Martinez		
Path/Ruta de acceso:		
Unconstrained/BUSINESS/John Deere/Industrial/Eng01 - Layout03 - 2025		
File name/Nombre del archivo:		
CR ISO 7 L201 Service & Todas las tareas		

Dept./Departamento	Approval/Aprobado	Sign./Firma	Date/Fecha
* Op. Dir. Sr.-AOM/Sr. Dir. Op.-AOM			
Work Cell Manager/Gerencia de Celula			
P.E. Mgr / Gie. Ingeniería Industrial			
Mfg. Eng. Mgr./Gie. Eng. Manufactura			
Facilities Mgr.			
TE Mgr./Gie. Eng. Pruebas			
IC Mgr./Gie. Control de inventarios			
OE Mgr./Gie. Calidad			
Mfg Mgr./Gie. Manufactura			

Icon/Simb.	Icon/Simbología
	ÁREAS DE PASILLOS, MAQUINARIA, BOTES DE BASURA, MATERIA PRIMA, PRODUCTO EN ESPERA DE INSPECCIÓN.
	ÁREAS PELIGROSAS (ELECTRICAS, QUIMICAS, ETC.) O DE PRECAUCIÓN
	PRODUCTO TERMINADO Y LIBERADO.
	PRODUCTO RECHAZADO, NO CONFORME, SCRAP, EN ESPERA DE DISPOSICIÓN, EXTINGUIDORES Y Desechos TOXICOS

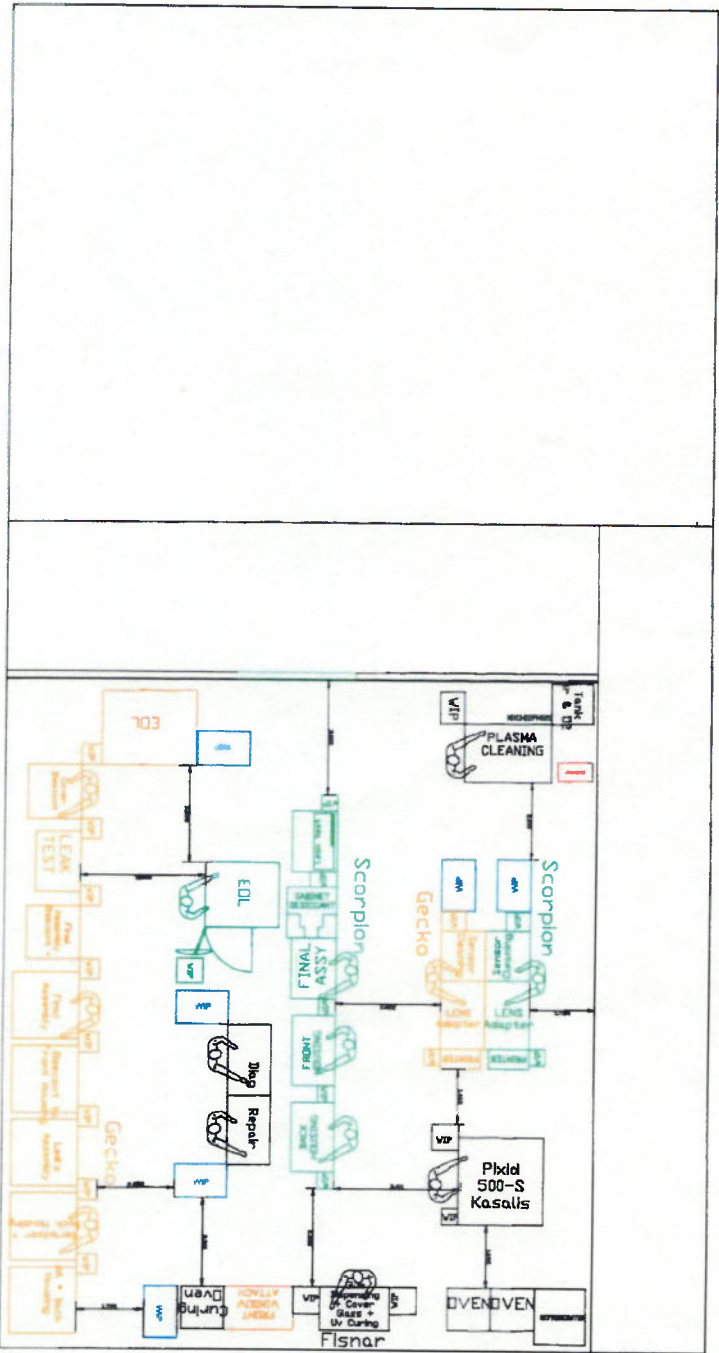

2-Mayo-25

Tiempo de retención en punto de origen: 5 años; NA en archivo muerto; Disposición final: Borrar

